

Projekt- und Qualitätsmanagement | PmQm

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Projekt oder Produkt	2
2. Innovation	2
3. Qualität	2
3.1. Datenqualität	3
4. Projektmanagement	3
4.1. Wasserfallmodell	3
4.1.1. Definition einer Phase	3
4.1.2. Arbeitspakete	3
4.2. HERMES	3
4.2.1. Rollen	4
4.2.2. Aufgaben	4
4.2.3. Ergebnisse	4
4.2.4. Sichten auf das Projekt	4
4.2.5. Szenarien	5
4.2.6. Entscheidungsprozess	5
4.2.7. HERMES und SCRUM	5
4.2.8. Vor- und Nachteile	5
4.3. V-Modell	6
4.4. PRINCE2	6
4.4.1. Vier integrierte Bausteine	6
4.4.2. Sieben Grundprinzipien	6
4.4.3. Sieben Themen	7
4.4.4. Sieben Prozesse	7
4.4.5. PRINCE2 Agile	8
4.5. Gantt	8
5. Agile Produktentwicklung	9
5.1. Arbeitspakete	9
5.2. Warum Agile?	9
5.2.1. Stacey-Matrix	10
5.2.2. Warum scheitern IT Projekte?	10
5.2.3. Warum werden agile Methoden verwendet	10
5.3. SCRUM	11
5.4. User Story und MVP	11

1. PROJEKT ODER PRODUKT

Produkt: ist etwas, das auf dem Markt verkauft werden kann

Projekt: eine Methode, die als Resultat ein Produkt hervorbringt

Projekt	Produkt
Einmaliges Vorhaben	Andauernde Entwicklung
Grosser Initialaufwand bis zum ersten sichtbaren Ergebnis	Mit MVP (Minimum Viable Product) sehr schnell ein erstes Ergebnis
Kundennutzen oft erst am Ende	Schneller und wachsender Kundennutzen
Mit OTOBOS sehr gute Planbarkeit von Zeit, Budget und Scope	Durch agile Entwicklungszyklen ständig ändernde Situation

OTOBOS: On Time, On Budget, On Specification



2. INNOVATION

Innovation ist der Prozess, bei dem eine Idee in ein Produkt umgewandelt wird, und einen Mehrwert für den Kunden schafft

Inkrementelle Innovation: bedeutet die allmähliche, aber kontinuierliche Verbesserung bestehender Technologien (Markt für Smartphones)

Disruptive Innovationen: führen zu neuen Technologien (Musik und Film-Streaming, digitale Fotografie)

Architektonische Innovationen: passen bestehende Komponenten eines Produkts einen neuen Markt und Zweck an (Smart Watch, EarPod als Hörgerät)

Radikale Innovation: ersetzt bestehende Angebote vollständig und erschliesst einen neuen Markt (Cloud Computing, AI)

3. QUALITÄT

Software Qualität Komponenten

Funktionalität	Was kann die Software
Zuverlässigkeit	in einem vorbestimmten Zeitraum unter vorbestimmten Bedingungen immer gleich stabil arbeiten
Effizienz	gute Performance mit minimalen Ressourcenanforderungen Effizienz
Benutzbarkeit / Usability	Wie komfortable und fehlerresistent ist die SW für den Benutzer
Übertragbarkeit	Wie einfach ist die SW auf andere Plattformen / OS übertragbar
Änderbarkeit	Wie einfach können Anpassungen vorgenommen oder neue Releases eingespielt werden

3.1. DATENQUALITÄT

Jede Applikation und jedes Projekt ist maximal so gut, wie die Qualität der darin verwalteten Daten. Zu vermeiden sind:

- Unzuverlässige und fehlerhafte Daten
- Inkonsistente und duplizierte Daten

4. PROJEKTMANAGEMENT

Es wird zwischen agil und klassisch unterschieden

- Klassische Vorgehensmethoden sind formell und strikt, was klare Aussagen zu Fortschritt und Inhalt zulässt. Sie haben einen grossen administrativen Aufwand und zeigen erst am Schluss den Erfolg.
- Agile Vorgehensmethoden basieren dank iterativem Vorgehen auf schlanken Prozessen und eignen sich idealerweise für die Entwicklung und Pflege von Produkten. Sie reduzieren die administrativen Aufwände auf ein Minimum.

4.1. WASSERFALLMODELL

- Beim Wasserfallmodell werden die einzelnen Phasen sequenziell durchlaufen.
- Die nachfolgende Phase kann erst mit vollständigem Abschluss der aktuellen Phase beginnen.
- Phasenwiederholungen und -rücksprünge sind eigentlich nicht vorgesehen.
- Sie können aber notwendig sein, wenn eine Phase nicht planmässig erfolgreich abgeschlossen werden kann.

4.1.1. Definition einer Phase

Im klassischen Projektmanagement werden die Arbeitspakete oder Tasks in logische Abschnitte, sprich Phasen unterteilt. Jede Phase wird durch einen Meilenstein terminiert.

Phasenübergänge werden auch «Gates» genannt. Sie werden oft durch ein übergeordnetes Gremium (z.B. Lenkungsausschuss) freigegeben.

Eine Parallelisierung von Phasen ist nicht vorgesehen, kommt jedoch in der Praxis vor.


4.1.2. Arbeitspakete

Die Aufgaben in einem Projekt werden in Arbeitspakete gepackt. Jedes Arbeitspaket soll in sich abgeschlossen sein und ein definiertes Ergebnis liefern. Es soll wenn möglich von einer Person / Team erledigt werden können. Arbeitspakete sollen den Projektphasen zugeteilt werden können.

4.2. HERMES

Handbuch der Elektronischen Rechenzentren des Bundes, eine Methode zur Entwicklung von Systemen. HERMES beschreibt verschiedene Szenarien:

- Alle Szenarien haben ein einheitliches Phasenmodell mit vier Phasen.



- Die Meilensteine entsprechen Quality Gates, an denen über Ergebnisse und das weitere Vorgehen entschieden wird.

- Module sind wiederverwendbare Bausteine zur Erstellung von Szenarien.
- Ein Modul enthält die thematisch zusammengehörenden Aufgaben, Ergebnisse und Rollen.

4.2.1. Rollen

HERMES unterteilt die Organisation in:

Stammesorganisation:

- Organisation des Auftraggebers und des Anwenders in der das Projekt angesiedelt ist
- Rechtliche Einheit, die Strategien und Vorgaben für das Projekt bestimmt

Projektorganisation:

- Temporäre Organisation
- Wird mit dem Projektinitialisierungsauftrag in kraft gesetzt und mit dem Projektabschluss aufgelöst

Hermes beschreibt 17 verschiedene Rollen

4.2.2. Aufgaben

In HERMES gibt es für jede der ca. 70 Aufgaben eine Aufgabenbeschreibung. Jeder Aufgabe ist eine verantwortliche Rolle zugeordnet. Thematisch zusammengehörende Aufgaben sind in Module gruppiert und den Phasen zugeordnet.

4.2.3. Ergebnisse

Für jedes der ca. 70 Ergebnisse gibt es in HERMES eine Ergebnisbeschreibung. Zudem sind Minimalergebnisse definiert, um die Anforderungen an die Projekt-Governance zu erfüllen (mehr als 40 Ergebnisse).

4.2.4. Sichten auf das Projekt

Sicht des zeitlichen Ablaufs:


- Welche Aufgaben und Ergebnisse in welcher Phase
- Welche Meilensteine

Sicht der Partner:

- Rollen und Aufgaben im Projekt
- Wo arbeitet diese Rolle mit

Sicht der Hierarchieebenen:

- Entscheidungsaufgaben und Ergebnisse
- Welche Rollen sind der Ebene zugeordnet

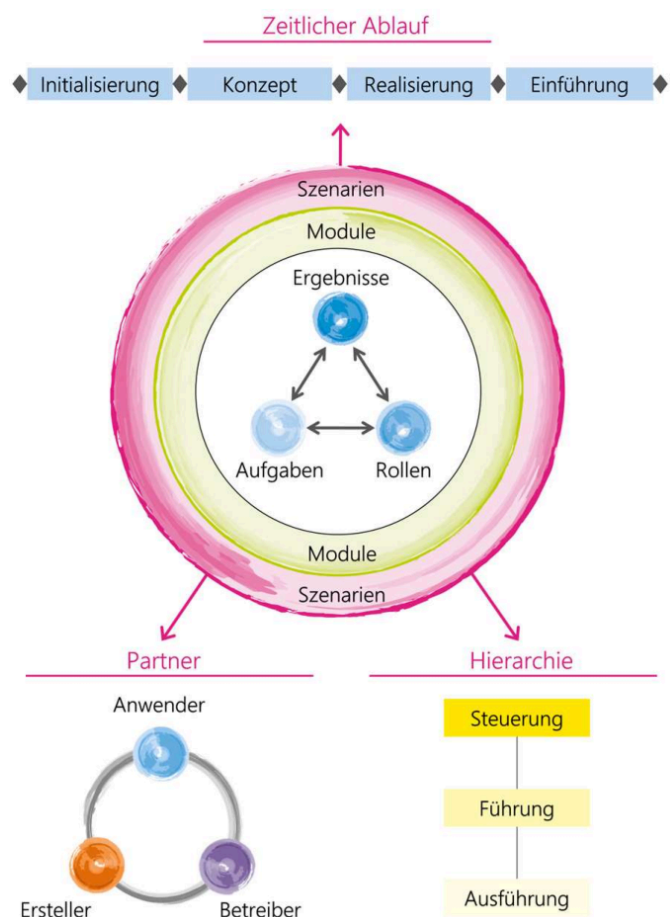


4.2.5. Szenarien

Ein Szenario ist auf die Durchführung eines Projekts mit einer spezifischen Charakteristik ausgerichtet. Die Szenarien bilden den gesamten Lebenszyklus des Projekts ab. Szenarien bilden Module, die thematisch zusammengehörende Aufgaben und Ergebnisse gruppieren.

4.2.6. Entscheidungsprozess

HERMES unterscheidet zwischen:

- Entscheide durch die Steuerung (oben - dunkelgelb)
- Entscheide durch die Projektführung (unten - hellgelb)

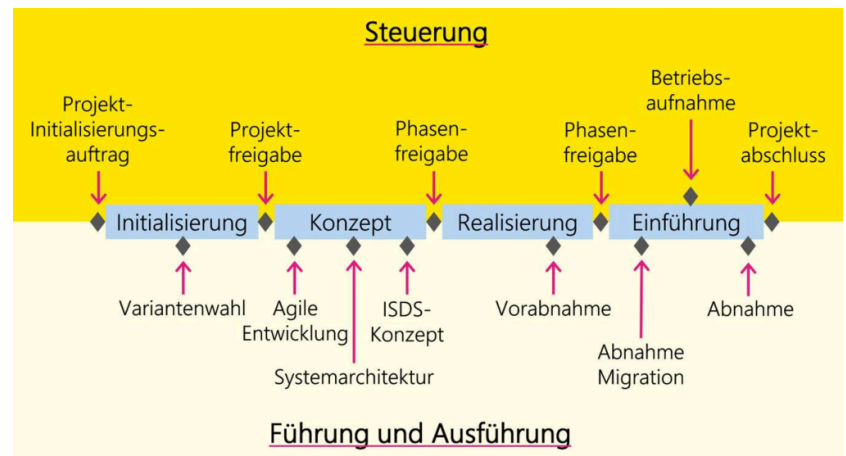

4.2.7. HERMES und SCRUM

HERMES deckt den gesamten Lebenszyklus des Projekts ab. SCRUM regelt die Organisation und die Steuerung des Entwicklungsteams.


4.2.8. Vor- und Nachteile

Pro	Contra
– Hohe Standardisierung mit klar definierten Phasen, Rollen, Aufgaben, Ergebnisse, etc. – Viele Tools und mehrsprachige Vorlagen vorhanden – Eine Zertifizierung erlaubt die Mitarbeit in Bundesprojekten – Einbettung von SCRUM ist klar definiert – Passt zu Institutionen, welche ihre Aufträge öffentlich ausschreiben oder Dienstleister, welche an den Ausschreibungen teilnehmen	– Sehr starke Vorgaben mit wenig Spielraum – Vier Phasen sind etwas knapp bemessen – In der Privatwirtschaft und ausserhalb der Schweiz kaum relevant – HERMES kann Projekte verkomplizieren und zwar so sehr, dass doch einige Bundesprojekte HERMES abspecken

4.3. V-MODELL

Das V-Modell ist ein lineares Vorgehensmodell, das ein Projekt in feste definierte Phasen gliedert. Im Vergleich zum ebenfalls linearen Wasserfallmodell ergänzt es Testphasen, die den jeweiligen Entwicklungsphasen gegenübergestellt sind.

Das V-Modell wird in Deutschland bei Bundesprojekten oft eingesetzt.

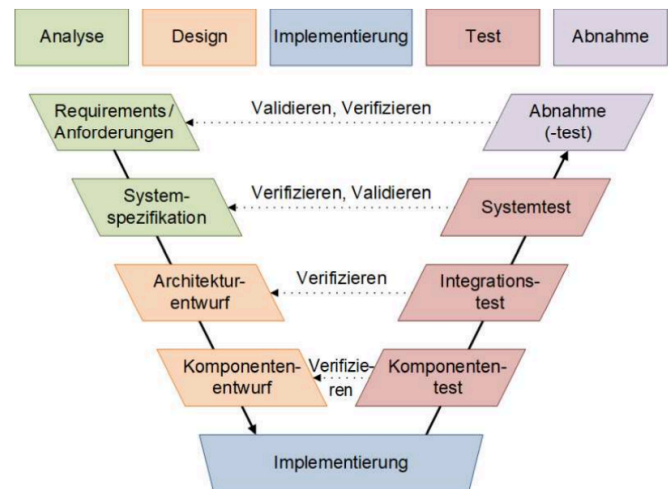

4.4. PRINCE2

PRoject IN Controlled Environemnts.

PRINCE2 ist so generisch wie nötig, jedoch so konkret wie möglich, um als ganzheitliche Projektmethodik wahrgenommen zu werden.

Die Methodik gibt die Empfehlungen und Eckpunkte vor, anhand derer der Rhythmus für die Meetings und Hinweise zu deren Inhalt gefunden werden kann.

Wichtigstes Grundprinzip ist: Die Methodik **muss** an die Projektumgebung angepasst werden

PRINCE2 Agile ist eine Erweiterung und Anpassung zum klassischen PRINCE2 für die agile Welt des Projektmanagements.

4.4.1. Vier integrierte Bausteine

- 1) Sieben Grundprinzipien: oder sieben Leitsätze, die in einem PRINCE2 Projekt eingehalten werden sollen
- 2) Sieben Themen: Beschreiben den Inhalt eines richtigen Projekts (nach PRINCE2)
- 3) Sieben Prozesse: Beschreiben den Ablauf rund um die sieben Themen
- 4) Anpassung an die Projektumgebung: Das Framework kann in weiten Teilen angepasst werden:
 - Vereinfachung der Methodik: Vereinfachung von Techniken und Praktiken
 - Formalisierung bzw. Informalisierung: Meetings werden angepasst - meist informeller
 - Umgestaltung von Formaten: Berichte und Tabellen anpassen
 - Zusammenführung und Splittung: Berichte adressatengerechter gestalten
 - Re-naming: Begrifflichkeiten auf die Organisation anpassen

4.4.2. Sieben Grundprinzipien

- 1) **Fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung:** Der Nutzen oder Mehrwert muss laufend überprüft werden → Business Case
- 2) **Lernen aus Erfahrung:** Erfahrungen aus früheren Projekten oder während des Projekts werden regelmäßig gesammelt und angewendet.
- 3) **Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten:** Diese müssen auch mit den entsprechenden Kompetenzen und Know How ausgestattet sein.
- 4) **Steuern über Management Phasen (abgeschlossene, eigenständige Projektphasen):** Am Ende muss der Projektmanager an den Lenkungsausschuss rapportieren.


- 5) **Steuern nach dem Ausnahmeprinzip (Management by Exception):** Gesteuert wird über das Ergebnis.
- 6) **Produktorientierung:** Den Blick auf die vom Projekt zu liefernden Produkte lenken
- 7) **Anpassung an die Projektumgebung:** (siehe Baustein vier)

4.4.3. Sieben Themen

- 1) **Business Case:** fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung. Mechanismus um «geschäftliche Rechtfertigung» zu erlangen und kontinuierlich zu pflegen
- 2) **Organisation:** definierte Rollen und Verantwortlichkeiten. WER ist für die Umsetzung für WAS verantwortlich?
- 3) **Qualität:** Produktorientierung. Kundenqualitätserwartungen in Projektabnahmekriterien überführen
- 4) **Pläne:** steuern über Managementphasen ; Produktorientierung. Wie wird die Planung umgesetzt und wie wird die Umsetzung gemacht?
- 5) **Risiko:** Umgang mit Unsicherheiten (positive wie negative) in einem Projekt
- 6) **Änderungen:** Struktur in das Änderungsverfahren und das Konfigurationsmanagement bringen
- 7) **Fortschritt:** (Reporting, Eskalationen und Toleranzbereich des Projekts). Versetzt das Projektmanagement und den Lenkungsausschuss in die Lage, Entscheidungen zu treffen.

4.4.4. Sieben Prozesse

Die Sieben Prozesse stellen die Ablaufbeschreibung zu den sieben Themen dar. Ein Prozess ist in PRINCE2 wie in der allgemeinen BWL wie folgt definiert: Für einen definierten Input wird über eine vorgeschriebene Abfolge von Aktivitäten Wertschöpfung generiert und ein definierter Output als Mehrwert geliefert.

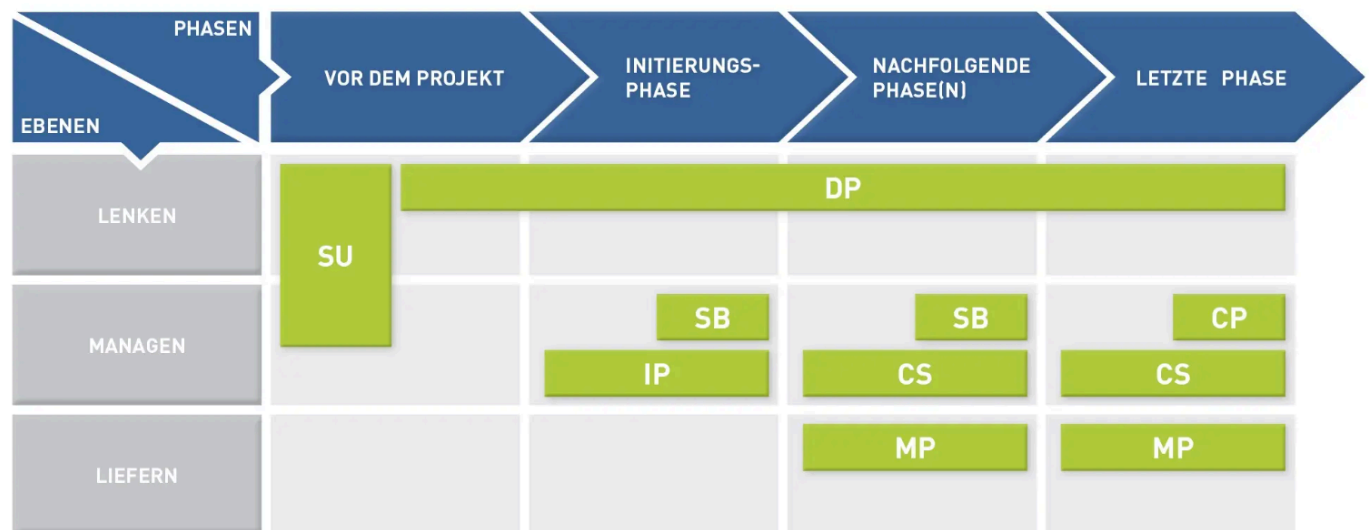

- 1) **Vorbereiten eines Projekts:** Starting up a project (SU)
 - Entspricht in etwa einer Vorstudie
 - Oft wird bei grossen Projekten in einer Vorstudie (oder Vorprojekt) die Planung des Grossprojekts erstellt und bestimmt, ob es sich überhaupt lohnt, es durchzuführen (Business Case, Proof of Concept)
- 2) **Lenken eines Projekts:** Directing a project (DP)
 - Wichtig für den Lenkungsausschuss - damit dieser in jeder Phase die Kontrolle behält
- 3) **Initiieren eines Projekts:** Initiating a project (IP)
 - Hauptprozess der ersten Projektphase

- Erstellung des Projektplans und der ersten Arbeitsverteilung
- 4) **Managen eines Phasenübergangs:** Managing a stage boundary (SB)
 - Definiert den Übergang einer Phase und kommt damit mehrfach identisch vor
- 5) **Steuern einer Phase:** Controlling a stage (CS)
 - Dieser Prozess ist am umfangreichsten beschrieben, da hier die Hauptarbeit des Projektmanagements liegt
- 6) **Managen der Produktlieferung:** Managing product delivery (MP)
 - Arbeitspakete innerhalb und am Ende des Projekts übergeben (innerhalb des Projektteams und zum Kunden)
- 7) **Abschliessen eines Projekts:** Closing a project (CP)
 - Erfolgreicher Projektabschluss mit allen Dokumenten und Formalitäten sicherstellen

4.4.5. PRINCE2 Agile


- Agile Entwicklungsmethoden wie Kanban, SCUM, Extrem Programming, ... stellen keinen ganzheitlichen Projektmanagementansatz dar. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines Produkts.
- PRINCE2 sagt von sich, einen generischen Ansatz zum umfassenden Projektmanagement darzustellen.
- Im Wesentlichen wird nur der Prozess «Managen der Produktlieferung (MP)» durch agile Zyklen erweitert. Die übrigen Prozesse bleiben dieselben.

8 Agile Guidance points:


- 1) **PRINCE2 ist die Basis:** PRINCE2 Agile ist keine neue Version, sondern nur eine Leitlinie, wie die Projektumgebung angepasst werden kann.
- 2) **PRINCE2 Agile ist neutral zum Entwicklungsprozess:** Damit können alle agilen Entwicklungsmethoden abgedeckt werden.
- 3) **Agilität kommt aus der IT. PRINCE2 Agile ist nicht IT-limitiert**
- 4) **Agile Frameworks sind oft IT-limitiert. PRINCE2 Agile nicht**
- 5) **PRINCE2 Agile ist nicht limitiert auf SCRUM**
- 6) **SCRUM und Kanban sind die am weitesten verbreiteten Frameworks**
- 7) **Agilität ist der Zusammenschluss von Behaviors, Konzepten, Framework und Techniken**
- 8) **Agilität ist nicht binär:** Es stellt sich also nicht die Frage ob agil oder nicht, sondern wie viel agil?

4.5. GANTT

Gantt-Diagramme sind eine der gängigsten und effektivsten Methoden, um Aktivitäten (Aufgaben und Ereignisse) zeitbezogen anzuzeigen.

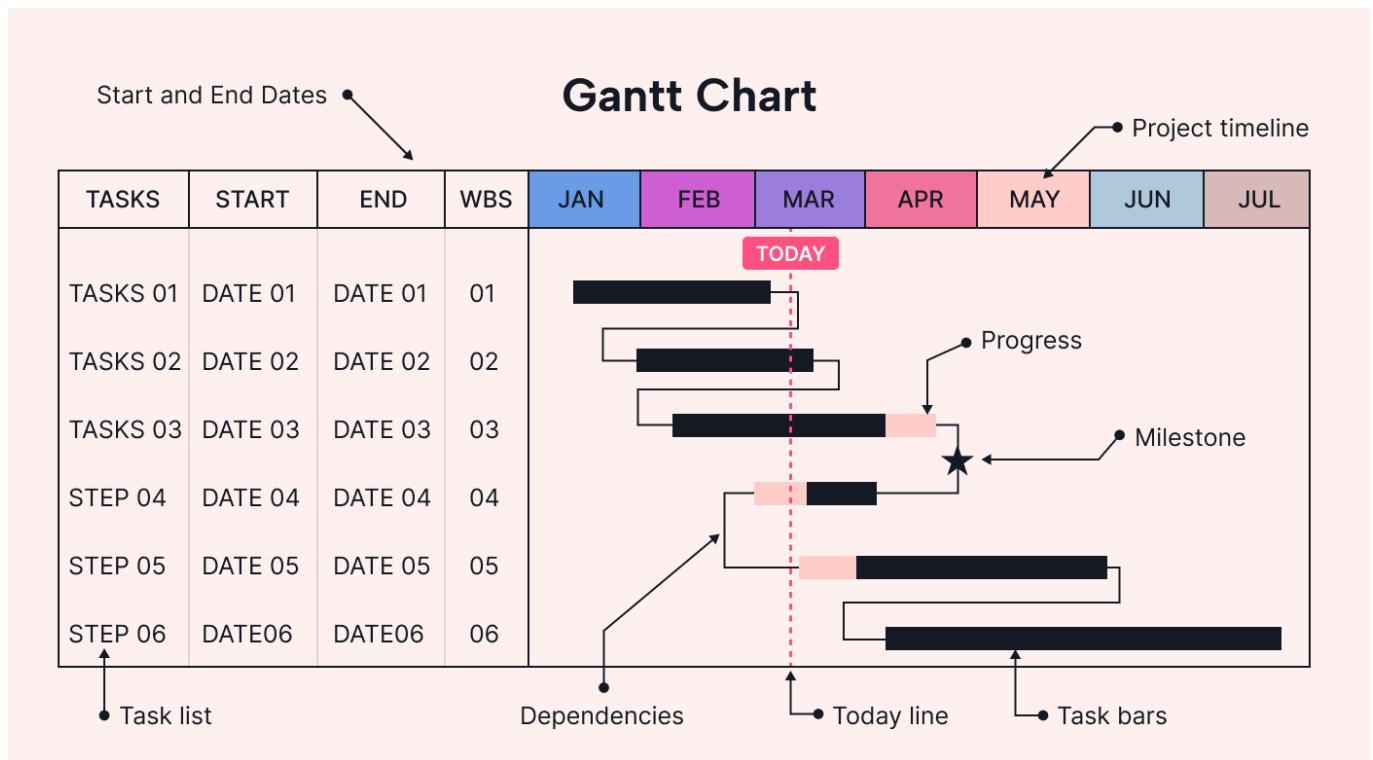

5. AGILE PRODUKTENTWICKLUNG

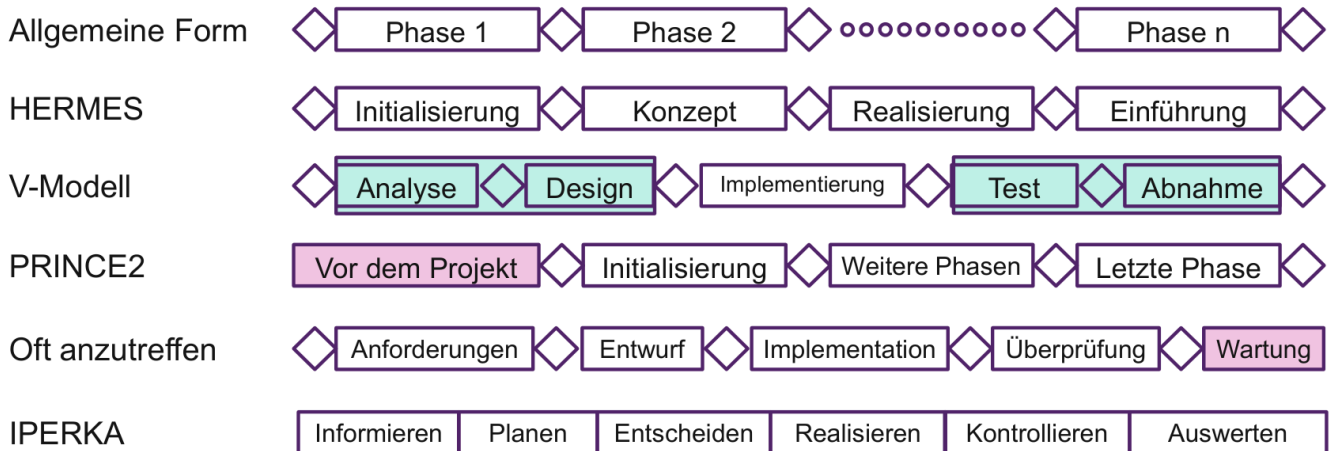

5.1. ARBEITSPAKETE

- Alle Aufgaben, die in einem klassischen Projekt ausgeführt werden, müssen in Arbeitspakete gepackt werden.
- Für jedes Arbeitspaket muss jemand zuständig sein.
- Wichtige Arbeitspakete werden von einer zweiten Person überprüft (4-Augen-Prinzip).
- Arbeitspakete sind in sich abgeschlossen und thematisch zusammenhängend.

5.2. WARUM AGILE?

V-Modell: stellt über die Validierung sicher, dass die Anforderungen und Konzepte auf allen Ebenen sauber validiert werden


HERMES: Beschreibt alles in allen Details und stellt alle Templates zur Verfügung

PRINCE2: Lässt sich flexibel an alle Umgebungen und Organisationen anpassen

Diese Modelle sind ideal für Werkverträge. Sie ermöglichen ein genau definiertes Ergebnis zu einem definierten Preis an einem vereinbarten Termin.

Im Laufe eines Projekts ergeben sich immer aber Veränderungen.

5.2.1. Stacey-Matrix

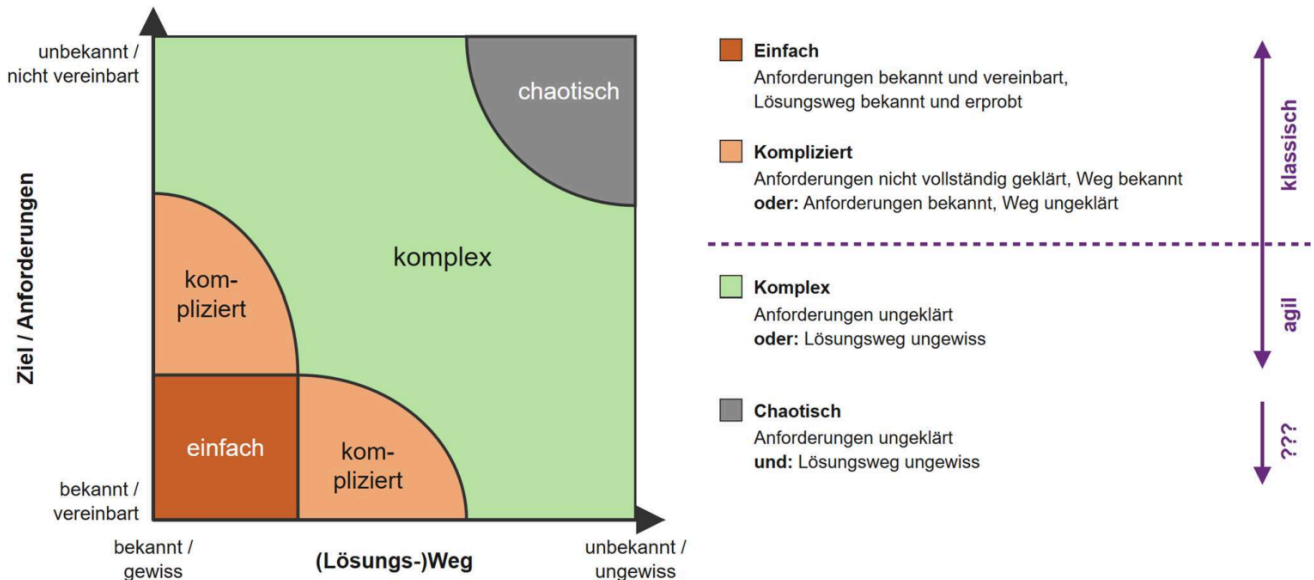

TODO:
cynefin

5.2.2. Warum scheitern IT Projekte?

- Schwammige Definition der IT-Projekte
- Planungs- und Methodenfehler
- Projektkommunikation funktioniert nicht
- Fehler bei der Ressourcenzuweisung
- Schlechtes Management von Abnahme und Deployment

5.2.3. Warum werden agile Methoden verwendet

Schneller Start: da zu dessen Beginn nicht alle Details bereits festgelegt und entschieden sein müssen.

Direkter Einfluss des Kunden auf den Projektverlauf: durch die Teilnahme an Meetings, Usability-Tests, Sprint-Planungen und persönliche Abnahme von Sprint- Ergebnissen.

Effektivere Arbeitsabläufe: wenig formeller Overhead

Hohe Flexibilität: gegenüber geänderten Wettbewerbsanforderungen, Kunden- und Nutzerbedürfnissen.

Fehler werden früh erkannt und behoben: damit können Risiken früher erkannt und minimiert werden.

Effektive Ergebnisse: die auf Kunden- und Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind

Schnelle Ergebnisse: und geringe Zeit bis zur Markteinführung (Time-to-Market)

TODO:
agile manifesto

5.3. SCRUM

TODO:

5.4. USER STORY UND MVP

TODO:
